

Ijtimoiy monitoring hisoboti

JAMOAT

Yarim yillik hisobot

2024 yil iyul-dekabr oylarini qamrab olgan davr uchun

Loyiha raqami: 45366-004

2025 yil iyun

O'zbekiston: Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishni takomillashtirish Loyiha

Toshkent shahar hokimligi "Maxsustrans" Davlat unitar korxonasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi va Osiyo taraqqiyot banki (OTB) uchun Infratech Consulting SDN Ltd. (O'zbekiston) ko'magida tayyorlangan.

Ushbu ijtimoiy monitoring hisoboti qarz oluvchining hujjatidir. Bu yerda bildirilgan fikrlar OTB Direktorlar kengashi, rahbariyati yoki xodimlarining fikrlarini aks ettirishi shart emas va ular dastlabki xarakterga ega bo'lishi mumkin. Sizning e'tiboringiz ["foydalanish shartlari"](#) ga qaratilgan OTB veb-saytining bo'limi.

Har qanday mamlakat dasturini yoki strategiyasini tayyorlashda, har qanday loyihani moliyalashtirishda yoki ushbu hujjatda ma'lum bir hudud yoki geografik hududni belgilash yoki unga havola qilish orqali OTB biron bir hudud yoki hududning huquqiy yoki boshqa maqomi bo'yicha hech qanday qaror qabul qilmoqchi emas.



**Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishni
takomillashtirish loyihasi OTB krediti: № 3067-UZB**

LOYIHALARNI BOSHQARISH, AMALGA OSHIRISH VA NAZORAT MASLAHAT XIZMATLARI

Shartnoma raqami: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01



Yarim yillik ijtimoiy kafolatlar Monitoring hisoboti

Hisobot davri: 2024 yil iyul-dekabr (yakuniy)

“MAXSUSTRANS” Davlat unitar korxonasi (O‘zbekiston)

Yarim yillik ijtimoiy himoya monitoringi hisoboti

2024 yil iyul-dekabr davr uchun 16-son yarim yillik hisobot (yakuniy)

Loyiha raqami: 45366
ADB Loan 3067-UZB

Loyihaning 1-versiyasi (2025 yil may)

UZB: Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish loyihasi (SWMIP) OTB tomonidan moliyalashtiriladi

Tayyorlagan: Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishni takomillashtirish loyihasining LAOG

Uchun: “Maxsustrans” Davlat unitar korxonasi, Toshkent shahar hokimligi va OTB

Tasdiqlangan: Jamoliddin Irbutayev – LAOG rahbari vazifasini bajaruvchi

Qisqartmalar

OTB	-	Osiyo taraqqiyot banki
AH	-	Ta'sirlangan uy xo'jaligi
AP	-	Ta'sir qilingan shaxs
CAP	-	Tuzatish bo'yicha harakatlar rejasi
HA	-	Ijrochi agentlik
GFP	-	Shikoyatlarni ko'rib chiqish markazi
GOU	-	O'zbekiston hukumati
GRM	-	Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi
Ha	-	gektar
IA	-	Amalga oshiruvchi agentlik
VA	-	Majburiy qayta joylashtirish
IWP	-	Norasmiy chiqindilarni yig'uvchi
LARP	-	Yer olish va ko'chirish rejasi
MOF	-	Moliya vazirligi
MSW	-	Qattiq maishiy chiqindilar
O&M	-	Foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish
PIU	-	Loyihani amalga oshirish bo'limi
PPTA	-	Loyihani tayyorlash bo'yicha texnik yordam
SLF	-	Sanitariya poligoni
SSEM	-	Ijtimoiy himoya va atrof-muhit monitoringi rejasi
AMOUNT	-	Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish

Lug'at

Kompensatsiya	Sotib olinadigan yoki unga ta'sir ko'rsatadigan aktiv uchun naqd yoki naqd pulda to'lov almashtirish qiymati bo'yicha loyiha.
Ta'sirlangan Shaxslar	Ta'sirlangan shaxslar to'liq yoki qisman, doimiy yoki vaqtincha jismoniy ko'chish (ko'chirish, turar-joy erlarini yo'qotish yoki boshpana yo'qotish) va (i) ixtiyoriy ravishda erni egallab olish yoki (ii) erni ixtiyoriy ravishda olish yoki (ii) er uchastkasidan foydalanishda qonuniy cheklashlar natijasida iqtisodiy ko'chish (er, mulk, mulk, daromad manbalari yoki yashash vositalaridan mahrum bo'lgan) bo'lganlardir. va muhofaza qilinadigan hududlar. AP uch xil bo'lishi mumkin: (i) to'liq yoki qisman yo'qolgan yerga rasmiy qonuniy huquqlarga ega bo'lgan shaxslar; (ii) o'zlari egallab turgan erni to'liq yoki qisman yo'qotgan, bunday yerlarga rasmiy qonuniy huquqlariga ega bo'lmagan, lekin milliy qonunlar bo'yicha tan olingan yoki tan olinishi mumkin bo'lgan bunday yerlarga da'volari bo'lgan shaxslar; va (iii) o'zlari egallab turgan erni to'liq yoki qisman yo'qotgan, bunday yerga nisbatan na rasmiy qonuniy huquqlarga, na tan olingan yoki tan olinadigan da'volarga ega bo'lmagan shaxslar.
Huquq	Zarar ko'rgan uy xo'jaliklarining yo'qotishlarining turi va darajasiga qarab, ularning ijtimoiy va iqtisodiy asoslarini tiklash uchun pul yoki turdagi kompensatsiyalar, ko'chirish xarajatlari, daromadlarni tiklash bo'yicha yordam, transfer yordami, daromadlarni almashtirish va biznesni tiklash bilan bog'liq boshqa joyga ko'chirishni o'z ichiga olgan chora-tadbirlar majmuasi. Barcha huquqlar barcha zarar ko'rgan uy xo'jaliklariga huquqlar matritsasiga muvofiq beriladi.
Hokimiyat	Mintaqaviy va milliy darajada mahalliy hamjamiyat va hukumat o'rtasida o'zaro aloqada bo'lgan mahalliy hokimiyat organi. U o'z yurisdiksiyasida yashovchi mahalliy aholi ustidan yakuniy ma'muriy va huquqiy hokimiyatga ega.
Yer sotib olish	Shaxsni davlat organi tomonidan adolatli tovon to'lash evaziga davlat ehtiyojlari uchun o'ziga tegishli yoki unga tegishli bo'lgan yerning to'liq yoki bir qismini o'z mulki va mulkiga o'tkazishga majburlash jarayoni.
Mahalla	Hukumat tomonidan tan olingan mahalliy darajadagi jamoatchilikka asoslangan tashkilot bolib, davlat va jamiyat o'rtasida aloqa o'rnatuvchi bo'lib xizmat qiladi va bir qator ijtimoiy qo'llab-quvvatlash vositalariga ko'maklashish hamda o'z a'zolarining ichki ijtimoiy va madaniy hamjihatligini ta'minlash uchun mas'uldir. Mahalla raislari mahalliy hamjamiyat tomonidan saylanadi.
Ma'noli Konsultatsiya	(i) loyihani tayyorlash bosqichining boshida boshlanadi va butun loyiha davomida doimiy ravishda amalga oshiriladigan jarayon; (ii) ta'sirlangan odamlar uchun tushunarli va qulay bo'lgan tegishli va adekvat ma'lumotlarning o'z vaqtida oshkor etilishini ta'minlaydi; (iii) qo'rqitish yoki majburlashdan xoli muhitda amalga oshiriladi; (iv) genderni qamrab oladigan va sezgir bo'lib, kam ta'minlangan va zaif guruhlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan; va (v) jabrlanuvchilar va boshqalarning barcha tegishli qarashlarini birlashtirish imkonini beradi

Loyihani ishlab chiqish, ta'sirni yumshatish choralari, rivojlanish foydalari va imkoniyatlarini baham ko'rish va amalga oshirish masalalari kabi qarorlar qabul qilishda manfaatdor tomonlar.

Noqonuniy

Tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, uy-joy va bog'dorchilikni ro'yxatdan o'tkazmagan, shuningdek, o'zlari egallab turgan yer uchastkalariga nisbatan hech qanday huquq va da'volari bo'lmagan, xususiy yoki davlat yerlaridan ruxsatsiz, ruxsatsiz yoki grantsiz foydalanayotgan shaxslar, ya'ni ular egallab turgan yoki foydalanayotgan er va (yoki) inshootlarni qonuniy ijaraga olinmagan fuqarolar kiradi. OTB siyosatida bunday odamlar yerga tegishli bo'lmagan mulklari uchun kompensatsiya olish huquqiga ega ekanligi aniq ko'rsatilgan.

O'zgartirish xarajat

Qayta tiklash qiymati yo'qolgan aktivlarni qoplashda rioya qilinishi kerak bo'lgan printsiptir. Hisoblash quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: (i) adolatli bozor qiymati; (ii) tranzaksiya xarajatlari; (iii) hisoblangan foizlar, (iv) o'tish va tiklash xarajatlari; va (v) agar mavjud bo'lsa, boshqa tegishli to'lovlar. Bozor sharoitlari mavjud bo'lmagan yoki shakllanish bosqichida bo'lgan hollarda, yaqinda amalga oshirilgan er operatsiyalari, erning turlari bo'yicha qiymati, yerga egalik huquqi, erdan foydalanish, ekin ekish shakllari va hosildorlik, loyiha hududida va mintaqada erlarning mavjudligi va boshqa tegishli ma'lumotlar to'g'risida tegishli ma'lumotlarni olish uchun AP va mezbon aholi bilan maslahatlashiladi. Uy-joy, uy turlari va qurilish materiallari bo'yicha dastlabki ma'lumotlar ham to'planadi. Malakali va tajribali ekspertlar sotib olingan aktivlarni baholashni o'z zimmlariga oladilar. Ushbu baholash usulini qo'llashda tuzilmalar va aktivlarning amortizatsiyasi hisobga olinmasligi kerak.

Muhim ta'sir

200 yoki undan ortiq odam katta ta'sirlarni boshdan kechiradi, ular quyidagilar bilan belgilanadi; (i) uy-joydan jismonan ko'chirilgan yoki (ii) ishlab chiqarish aktivlarining 10% yoki undan ko'prog'ini yo'qotish (daromad).

Zaif Uy xo'jaliklari

Kam ta'minlangan uy xo'jaliklari, 2 dan kam daromadli kattalar bo'lgan oila boshlig'i ayollar, ishsiz oila a'zolari bo'lgan keksalar va nogironlar.

Ijarachi

O'ziga uzoq muddatli ijaraga berilgan yer uchastkalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni yurituvchi yuridik shaxs (ro'yxatga olingan fermer xo'jaligi). Ijara muddati ellik yilgacha, lekin o'n yildan kam bo'lmasligi kerak. Ijaraga oluvchi erni sota olmaydi, sotib olmaydi, garovga qo'ya olmaydi, ijaraga bera olmaydi.

Mundarija

Qisqartmalar	3
Lug'at.....	4
1. Xulosa.....	7
2. Kirish.....	11
3. Loyiha shartnomalari va boshqaruvi.....	12
4. 2024-yil iyul-dekabr oylaridagi ijtimoiy himoya tadbirlari.....	13
4.1 Ma'ruza va metodologiyaning maqsadlari.	13
4.2 Ijtimoiy himoya monitoringi hisoboti doirasi.....	13
4.3 2024 yil iyul-dekabr oylaridagi loyiha faoliyati	14
4.4 Qurilish davri uchun loyiha monitoringi	16
5. Shikoyatlarni bartaraf etish	19
6. Aholini xabardor qilish va konsultatsiyalar.	20
7. Xulosa.	21
8. Ilovalar.....	22

1. Xulosa

1. **O‘zbekiston hukumati** – Poytaxt Toshkent shahrining qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini rivojlantirish va takomillashtirish uchun Osiyo taraqqiyot bankidan kredit olish uchun ariza berdi. OTB loyihani 2013-yil 27-noyabrda o‘zining oddiy kapital resurslaridan 69,0 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag‘i bilan tasdiqladi. Kredit ma‘lumotnoma raqami L3067-UZB: Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishni takomillashtirish loyihasi (SWMIP). O‘zbekiston Respublikasi va OTB o‘rtasida 2014-yil 27-fevralda kredit shartnomasi, OTB, Toshkent shahar hokimligi va “Maxsustrans” Davlat unitar korxonasi o‘rtasida Loyiha bitimi 2014-yil 12-martda imzolangan. Kredit shartnomasi 2014-yil 29-dekabrda kuchga kirdi. Toshkent shahrida qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish.
2. **Kreditni uzaytirish (birinchi so'rov).** Loyiha dastlab besh yillik amalga oshirish uchun mo‘ljallangan, kredit muddati 2019-yil 30-iyun. kechikishlar (birinchi shartnoma faqat 2016-yilda tuzilgan) Ijrochi agentlikning yetarli salohiyati yo‘qligi va Hukumatning shartnomani ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonining uzayganligi sababli.
3. **Kreditni uzaytirish (ikkinchi so'rov).** O‘zbekiston Moliya vazirligining 2021-yil 26-mart va 2021-yil 17-iyuldagi xatlariga asosan OTB 2021-yil 23-iyulda 30-chiqindixona qurilishi komponentining muvaffaqiyatli yakunlanishini ta‘minlash uchun qayta ko‘rib chiqilgan Kredit yopilish sanasi bilan 2021 yil 30 iyundan 2023 yil 31 dekabrgacha kredit muddatini bir oyga uzaytirish. Ushbu ma‘qullash OTB tomonidan OTBga taqdim etilgan va Toshkent shahar hokimligi, "Maxsustrans" va PIU tomonidan amalga oshirilishi lozim bo‘lgan muddatlarda belgilangan harakatlar rejasi va ta'sirni yumshatish choralariga qat'iy rioya qilish majburiyatini hisobga olgan holda post-fakto asosda berildi.
4. **Kreditni uzaytirish (uchinchi talab).** 2023-yil 18-sentabrda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi kreditni yopish muddatini uchinchi marta, ya‘ni 2023-yil 31-dekabrda 2024-yil 31-dekabrgacha uzaytirish to‘g‘risida so‘rov yubordi. 2023-yil 26-sentabrda “Maxsustrans” chiqindixona qurilishi va qurilish ishlari 2023-yilning 32-yilgacha yakunlanishiga kechikishlar sabab, kredit muddatini uzaytirish uchun qo‘shimcha asoslar keltirdi. kechikishlar (i) 2022-yilning noyabridan 2023-yilning martigacha bo‘lgan davrda noqulay ob-havo sharoiti va (ii) er osti suvlari darajasining yuqoriligi aniqlanganligi sababli chiqindixonaning kirish yo‘li va uchinchi kamerasidagi dizayn o‘zgarishlari bilan bog‘liq. OTB 2023-yil 25-dekabrda loyihaning qolgan barcha tadbirlarini kengaytirilgan muddatda yakunlash bo‘yicha Hukumat majburiyatini hisobga olgan holda o‘z roziligini berdi.
5. **Loyihaning umumiy maqsadi** shahar infratuzilmasi va xizmatlarini yangilash uchun poytaxt Toshkent shahrida takomillashtirilgan SWM tizimini ta'minlashdan iborat. Loyihaning ta'siri shahar atrof-muhitini va Toshkent aholisi uchun hayot sifatini yaxshilashdir. Kutilayotgan natija Toshkent shahrida SWM xizmatlari va boshqaruvini yaxshilashdir. Loyiha uchta natijaga ega: **1-chi mahsulot** – Toshkent shahridagi SWM tizimi qayta tiklandi va kengaytirildi; **chiqish 2** - operatsion quvvatni kuchaytirdi; va **chiqish 3** - milliy SWM strategiyasi. Toshkent shahar hokimligi 1- va 2-chi-chiqarishlar bo‘yicha Ijrochi agentlik, O‘zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘ymitasi 3-chi mahsulot bo‘yicha Ijrochi agentlik hisoblanadi. “Maxsustrans” loyihaning kundalik amalga oshirilishi uchun mas‘ul ijrochi agentlik hisoblanadi.
6. Loyihaning umumiy qiymati **76,3 million dollar** ekvivalentini (shundan OTB krediti 69,0 million dollar) tashkil etadi, bunda soliqlar va bojlar, imtiyozlar va amalga oshirish davridagi moliyaviy to‘lovlar Hukumat tomonidan qoplanadi.

Loyiha moliyalashtirildi:

- qattiq maishiy maishiy chiqindilarni yig'ish va tashish uchun chiqindi mashinalarini yetkazib berish;
- sanitariya poligonini jihozlar va texnika bilan ta'minlash;
- chiqindilarni yig'ish punktlari va chiqindilarni tashish uchun konteynerlar bilan ta'minlash
- “Maxsustrans”ning Toshkent shahrida joylashgan ikkita uzatish stansiyasini qayta tiklash;
- “Maxsustrans”ning Toshkent shahrida joylashgan ikkita garajini rekonstruksiya qilish;
- Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yangi sanitariya poligonini qurish;
- qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish bo'yicha Milliy strategiyani, shu jumladan sektor investitsiya dasturini tayyorlash;
- “Maxsustrans”ning salohiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, shu jumladan faoliyat sohalarida va boshqaruv va Loyihani amalga oshirish;
- chiqindilarni minimallashtirish va qayta ishlash dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va aholini chiqindilarni minimallashtirish va qayta ishlash bo'yicha xabardor qilish kampaniyasi.

7. **Chiqindilarni yig'ish punktlarini qurish va qayta tiklash ishlari** “Maxsustrans”ning o'z mablag'lari hisobidan, **mavjud chiqindixonaning yopilishi esa** Koreyaning “Sejin G&E Co. Ltd.” kompaniyasi tomonidan moliyalashtirildi – batafsil ma'lumot uchun quyidagi keyingi bobga qarang. Shu sababli, ushbu ish komponentlari endi Loyihaning bir qismi emas. Chiqindixona Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida, Toshkent shahri markazidan taxminan 35 km janubda joylashgan. Inshoot 1967-yildan beri foydalanilib kelinmoqda va hozirda Toshkent shahridan va uning atrofidagi tumanlardan to'plangan chiqindilarni qayta ishlamoqda. Yangi qurilayotgan poligon mavjud Oxangaron chiqindixonaning sharqiy tomonida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 30 gektar qishloq xo'jaligi erlarini egallaydi.
8. **Ijtimoiy himoya monitoringi** loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelgan har qanday ijtimoiy muammolar haqida xabar berish uchun amalga oshiriladi. Ijtimoiy himoya monitoringi OTB talablariga muvofiq yerlarni olib qo'yish va majburiy ko'chirish masalalari bo'yicha amalga oshiriladi. Ijtimoiy himoya choralari monitoringi uchun boshlang'ich asos sifatida chiqindixona hududi uchun mo'ljallangan 2013 yil avgustdagi Ko'chirish rejasi hisoblanadi. Ushbu yarim yillik ijtimoiy himoya monitoringi hisoboti xizmat ko'rsatish uchun tayyorlangan loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha OTB kafolatlariga rioya qilish maqsadi. Ushbu hisobot *2024 yil iyul-dekabr* oylarini qamrab oladi .
9. **Er olish va ko'chirish:** Yangi poligon qurish bilan bog'liq yerga loyihaning ta'sirini texnik-iqtisodiy asoslash bosqichida baholash uchun loyiha doirasida 2012 yilda yer olish va ko'chirish rejasi ishlab chiqilgan. OTB talablariga muvofiq LARP loyihani batafsil loyihalash bosqichida yangilanishi kerak. Loyiha toifasi B toifasi sifatida belgilandi. 2019-yil oktabr oyida SLF loyihasining batafsil loyihasi qurilish bo'yicha mahalliy hokimiyatning roziligi bilan yakunlandi. Ijtimoiy himoya choralari monitoring qilish va LARPni yangilash doirasida 2019-yil oktabr oyida tegishli ekspertiza o'tkazildi va OTB tomonidan tasdiqlandi. Tegishli ekspertiza loyiha doirasida erlarni majburiy olib qo'yish va ko'chirish ta'siri yo'qligini tasdiqladi. OTB so'roviga ko'ra, tegishli ekspertiza hisoboti 2020-yil aprel oyida yangilandi va unda yer olish va ko'chirishga ta'siri bo'yicha batafsil tushuntirishlar kiritildi. Tegishli tekshirish bo'yicha yangilangan hisobot 2020-yil may oyida OTB ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan.
10. **Ta'sir ko'rsatgan fermerning shikoyati:** OTB 2024 yil 11 noyabrdan 15 noyabrgacha Loyihaga kreditlarni ko'rib chiqish missiyasini yubordi. Missiya 2024 yil 11 noyabrda Ohangaron tumanidagi yangi poligon maydoniga tashrif buyurdi. Missiya kirish yo'li qurilishi tugaganligini aniqladi; biroq yonma-yon joylashgan sug'orish kanalidan suv sizib chiqmasligi va yo'l poydevoriga ta'sir qilmasligi uchun to'sib qo'yilgan. 2024-yil noyabridan boshlab “Maxsustrans” kanalni rekonstruksiya qilmoqda

kirish yo'lini va poligonni suv bilan bog'liq shikastlanishdan himoya qiling. "Maxsustrans" missiyaga fermer Xushnadbek Hakimov ("Shahboz nuri ziyo" fermer xo'jaligi rahbari) magistral kanaldan ("Hamza") o'z qishloq xo'jaligi yerlariga suv o'tkazish uchun ushbu sug'orish kanalidan foydalangani, biroq kanalda qurilish ishlari olib borilayotgani sababli u suvdan mahrum bo'lganini ma'lum qildi.

Biroq jabrlangan fermer 2023-yil avgust oyidan buyon ekinlarini sug'orishga qurbi yetmayotganini, bu uning hosildorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatganini, bu esa faqat davlat g'alla kvotasini bajarishga imkon berganini aytdi. Shuningdek, hozirgi g'alla ekinlariga ta'sir qiladigan suv tanqisligi haqida tashvish bildirdi.

11. 2024-yil 12-noyabrda OTB bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda "Maxsustrans" kompaniyasi chiqindixonadan suv chiqarish orqali suvga vaqtincha kirishni ta'minlaganliklarini ma'lum qildi va agar fermerga zudlik bilan suv kerak bo'lsa, sug'orish kanalini qayta ochishga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Qolaversa, o'sha fermer 339-konturdan qonuniy yer ijarasi huquqiga ega bo'lgan 2,5 gektar hech qanday tovon pulisiz chiqindixona qurish uchun ajratilganini aytib, yer tovonini to'lash bo'yicha keskin masala ko'tardi.
12. Missiya, shuningdek, loyihaga kelib tushgan shikoyatlarni qayd etish va ko'rib chiqishda muvofiqlik bo'yicha asosiy talab bo'lgan Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi (GRM) jurnali yo'qligini ham qayd etdi. Bundan tashqari, suv ta'minotining yo'qligi, fermerning 2,5 gektar yer maydonining (339-konturdan) kompensatsiyasiz poligon qurish uchun o'zlashtirilishi kabi masalalar o'tgan yarim yillik ijtimoiy monitoring hisobotlarining birortasiga kiritilmagan.
13. **Chiqindilarni chiqindilardan energiyaga aylantirish loyihasi:** 2024 yil iyul-dekabr oylarida Sejin G&E Co., Ltd kompaniyasining mavjud chiqindixonada sezilarli qurilish ishlari kuzatilmadi. Avval xabar qilinganidek, Ohangaron tumani hokimining 15.06.2019 yildagi 3861-sonli qaroriga asosan "Sejin G&E Co., Ltd" kompaniyasiga biogaz qurilmasini o'rnatish uchun 1 gektar yer uchastkasi ajratilgan. "Maxsustrans". Bu yerning o'zlashtirilishi natijasida yaqin atrofdagi qishloqlar aholisiga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatilmagan.
14. **Gender harakatlar rejasi:** GAP 2024-yil 31-dekabr holatiga ko'ra SWMIP PIU tomonidan yangilangan va 2025-yil 10-yanvarda OTBga taqdim etilgan. Hozirgacha hech qanday izoh olinmagan.
15. **Shikoyatlarni ko'rib chiqish:** Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi LARP 2012 loyihasi uchun ishlab chiqilgan. Shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayoni monitoring hisobotlari orqali OTBga xabar qilinadi. Nazorat bo'yicha maslahatchi vaqti-vaqti bilan GRM samaradorligi va samaradorligini ko'rib chiqdi va qayd etib, loyihaning shikoyatlarni oldini olish va hal qilish qobiliyatini ta'kidladi. Monitoring davrida 2024-yil noyabr oyida OTB missiyasi chog'ida jabrlangan fermer Xushnadbek Hakimovning shikoyatidan tashqari yaqin atrofdagi aholi va uy xo'jaliklaridan hech qanday shikoyatlar qayd etilmadi.
16. **Aholini xabardor qilish va maslahatlar:** Monitoring davrida hech qanday jamoatchilik maslahati o'tkazilmagan olib borildi.
17. **Loyihaning qisqacha maqomi:** Ayni paytda SWMIP doirasida bitta ish shartnomasi mavjud amalga oshirish:

Loyiha faoliyati	2024 yil 31 dekabr holatiga ko'ra	Monitoring
CW1-R sanitariya poligoni Tashkil etish	2022-yil 31-yanvarda "Maxsustrans" DUK va "STECOL-POWERCHINA GUIYANG" QK (Xitoy) o'rtasida shartnoma imzolangan.	Ijtimoiy himoya monitoringi yangi poligondagi qurilish ishlari davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday ijtimoiy muammolarni qamrab oladi.

2024-yil iyul-dekabr davr uchun 16-son yarim yillik ijtimoiy himoya monitoringi
hisoboti Shartnoma raqami: DUK/ Maxsustrans/ QCBS-Cons_1-2016-01

	Pudratchi mart oyida safarbar qilingan 2022. Ishlarning boshlanish sanasi 2022 yil 8 aprel. Rejalashtirilgan ishlarni yakunlash sanasi 2024 yil 31 iyul (Shartnomaning 1-sonli tuzatishiga ko'ra), lekin haqiqiy sana - 2024 yil 26 sentyabr. Bugungi kunda qurilish ishlari yakunlandi va uchastka yakuniy sinovdan o'tkazish va ishga tushirish uchun tayyorlandi.	Sejin G&E Co., Ltd (Koreya) tomonidan eski chiqindixonada qurilish ishlari bajarilmaganligi sababli monitoring hisobot davrida amalga oshirilmagan.
--	--	--

2. Kirish

18. Ushbu hisobot SWMIP doirasidagi 16 -yarim yillik ijtimoiy himoya monitoringi hisobotidir. Hisobot Hukumat Hukumati va OTBning ijtimoiy himoya talablariga rioya qilish hamda Qarz oluvchi va OTB o'rtasida imzolangan: 3067-UZB Kredit shartnomasida ko'rsatilgan shartlarni bajarish uchun tayyorlangan.
19. Hisobot 2024-yilning iyul-dekabr oylari davomida ijtimoiy himoya choralari bo'yicha faoliyat monitoringi va baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu hisobot, xususan, loyihaning ijtimoiy himoya ko'rsatkichlari holatini qamrab oladi. Ushbu hisobotning maqsadi: (i) loyihani amalga oshirishning umumiy jarayonini ko'rib chiqish; (ii) loyihani amalga oshirishda duch keladigan har qanday ijtimoiy muammolar va cheklovlarni aniqlash; (iii) qurilishni ijtimoiy muhofaza qilish monitoringi ko'rsatkichlarini ishlab chiqish; (iv) yumshatish choralari tavsifiya etish (agar kerak bo'lsa). Hisobot monitoring davrida Loyihaning ijtimoiy himoya ko'rsatkichlarining holatini tavsiflaydi.
20. Loyiha doirasida himoya choralari monitoringini o'tkazish uchun 2016-yilda xalqaro tanlov orqali Infratech Consulting SDN Ltd. (O'zbekiston) vakili bo'lgan PIU maslahatchisi tanlab olindi va 2017-yil 11-yanvarda konsalting xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzolandi va shartnomaga muvofiq xizmat muddati 2024-yil 31-dekabrgacha.
21. SLF loyihalash va nazorat qilish xizmatlari China Urban Construction Design & tomonidan taqdim etiladi. Research Institute Co., Ltd. (CUCD) 2018 yil 16 noyabrdagi Shartnoma Cons_2 asosida (Nazorat bo'yicha maslahatchi). Loyihalash xizmatlari 2019-yil oktabr oyida yakunlandi. Uzoq tanlovdan so'ng 2022-yil yanvar oyida ish shartnomasi imzolandi va pudratchi 2022-yil aprel oyida saytga safarbar qilindi. CUCD nazorat xizmatlari 2022-yilning may oyida boshlangan, biroq uzoq vaqt davomida ko'rib chiqish va shartnomaga 4-sonli o'zgartirish ma'qullanganligi sababli CUCD xizmatlarni 2022-yilning 24-iyuniga qadar to'xtatib turishga majbur bo'ldi. Nazorat bo'yicha maslahatchining xizmat qilish muddati 2023 yil 31 oktyabrdan 2024 yil 31 dekabrgacha va ba'zi asosiy mutaxassislarni almashtirish. Nazorat xizmatlari 2025-yil 14-fevralda 4-tuzatish imzolanganidan keyin 2025-yilning mart oyida qayta tiklandi. De-fakto Nazorat bo'yicha maslahatchi o'z xizmatlarini 2025-yil aprel oyi oxirigacha tugatdi.
22. Mahalliy hokimiyat tomonidan chiqindixonani qurish bo'yicha batafsil loyiha tasdiqlanganidan so'ng, "Maxsustrans" kompaniyasi 2019-yil oktabr oyida CW1-R: Sanitariya poligonini tashkil etish va chiqindixonani yopish ishlari bo'yicha xalqaro tanlov tanlovini boshladi. Birinchi taklif 2021-yil oktabr oyida chiqindixonani yopish loyihasidan chiqarilishi sababli bekor qilindi. Qayta ko'rib chiqish 2022 yil yanvar oyida "Stecol- POWERCHINA GUIYANG" QK (Xitoy) bilan shartnoma tuzish orqali yakunlandi. Ishlar 2022-yil 8-aprelda boshlangan va amalda 2 024-yil 26-sentabrda yakunlangan (2024-yil 31-iyulda rejalashtirilgan). Nazorat bo'yicha maslahatchi standart FIDIC shartnomasi (qizil kitob) asosida tayyorlangan CW1-R ish shartnomasi bo'yicha muhandis sifatida ishlagan.
23. Dastlabki ko'chirish rejasi OTB tomonidan 2013-yil avgust oyida e'lon qilingan. Majburiy ko'chirish ta'siri bo'yicha tegishli ekspertiza 2019-yil oktabr oyida – yangi SLFni batafsil loyihalash tugagandan so'ng amalga oshirildi. Tegishli ekspertiza shuni ko'rsatdiki, loyiha uchun yer olish va poligon qurish uchun majburiy ko'chirish talab etilmaydi.
24. Ijtimoiy himoya bo'yicha monitoring har yarim yilda bir marta PIU maslahatchisi tomonidan amalga oshirildi. Maslahatchi muntazam ravishda loyihani amalga oshirish holati va loyihaning mumkin bo'lgan ta'siriga o'z vaqtida javob berish haqida ma'lumot to'pladi. Himoya monitoringining asosiy maqsadi ta'minlashdir

loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday salbiy loyiha ta'siri yoki boshqa ijtimoiy muammolar bo'yicha ijtimoiy himoya masalalarini baholash.

25. Janubiy Koreyaning "SEJIN G&E CO., LTD" kompaniyasi bilan "Waste-to energy" investitsiya loyihasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-noyabrda 895-son qarori bilan tasdiqlangan. Loyiha maydoni utilizatsiya qilingan chiqindilardan biogaz ishlab chiqarishga mo'ljallangan mavjud chiqindixonada hisoblanadi. Chiqindixonada loyihasi OTB loyihasi uchun bog'langan sayt sifatida qaraladi. Hisobot davrida mavjud chiqindixonada qurilish ishlari kuzatilmagan.

3. Loyiha shartnomalari va boshqaruvi

26. Loyihani boshqarish "Maxsustrans" DUK tomonidan amalga oshiriladi, bu loyihani kundalik amalga oshirish va muvofiqlashtirish uchun mas'ul ijrochi agentlik (IA) hisoblanadi. Hozirda IA direktori Komoliddin Nabiev va uning birinchi o'rinbosari janob Mirjamol Soatov tomonidan boshqariladi. Prezidentning 15.12.2020 yildagi 4925-son qaroriga muvofiq "Maxsustrans" DUK Toshkent shahar hokimligi tasarrufiga o'tkazildi¹. "Maxsustrans" DUKda tashkil etilgan Loyihani amalga oshirish guruhi (PIU) SWMIPni amalga oshirish, monitoring qilish va hisobot berishda yordam berish uchun javobgardir. PIU konsalting xizmatlarini ko'rsatishni, tovarlarni etkazib berishni va qurilish ishlarini bajarishni muvofiqlashtiradi, bu ish yondashuvining izchilligini ta'minlaydi va ishning borishi haqida hisobot beradi. 2023-yil dekabr oyidan boshlab PIUga guruh rahbari vazifasini bajaruvchi Jamoliddin Irbutayev rahbarlik qildi.
27. 2017-yil avgust oyida PIU maslahatchisi – HP Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG, GKW Consult GmbH va Eng Invest Consulting Ltd2 qo'shma korxonasi o'z xizmatlarini boshladi. 2020-yil 24-iyul kuni "Maxsustrans" HP Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG kompaniyasidan rasmiy xat oldi. Nürnberg mahalliy sudining Germaniya qonunchiligiga muvofiq HP Gauff Ingenieure GmbH & Co. 2020-yil 17-sentabrda PIU HPGauff Ingenieure GmbH & Co. KG kompaniyasidan SUE/Maxsustrans/ QCBS-Cons 1-2016-01-sonli so'magastda somranu kiritilmaganligi to'g'risida rasmiy xat oldi.
28. 2020-yil dekabr oyida "Maxsustrans" PIU maslahatchisi shartnomasiga o'zgartirish kiritdi, unga ko'ra PIU ni qo'llab-quvvatlash xizmatlari faqat Infratech Consulting SDN Ltd. tomonidan davom ettirilgan. 2024-yil dekabr oyi oxirigacha PIU Maslahatchi guruhini milliy guruh rahbari o'rinbosari Dilshod Mavlyan-Qariyev boshqardi va xalqaro guruh rahbari Ingo Shuebning cheklangan ko'magida. Milliy ekspertlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash PIU maslahatchisining xizmat qilish muddati 2024-yil 31-dekabrgacha uzaytirildi.
29. SLF Dizayn va Nazorat Maslahatchisi (CUCD, Xitoy) 2019-yil oktabr oyida, 2021-yil oxirida dizayn xizmatlarini tugatgandan so'ng, CW1-R to'plami bo'yicha takliflarni baholashga va g'olib kompaniya bilan shartnoma bo'yicha muzokaralar olib borishga yordam berdi. 2022 yil may oyidan boshlab Maslahatchi o'zining nazorat xizmatlarini taqdim etdi, shu jumladan saytdagi xavfsizlik monitoringi va hisobotini qo'llab-quvvatlaydi. Shartnomaga 2022-yil 25-apreldagi 3-sonli o'zgartirishga muvofiq, nazorat xizmatlari 2022-yil 5-maydan boshlangan va 2023-yil 31-oktabrgacha uzaytirilgan, ikkita asosiy mutaxassis almashtirilgan va texnik topshiriqlar saytdagi haqiqiy ehtiyojlarni hisobga olgan holda o'zgartirilgan. Ushbu Maslahatchi chiqindixonada qurilish ishlarini olib borishda mualliflik loyihasi, qurilish nazorati va himoya nazorati uchun mas'ul edi. Hisobot davrida nazorat bo'yicha maslahatchi ishlamadi, chunki xizmatlar o'shandan beri to'xtatilgan

¹O'zbekiston Prezidentining 4925-son qarori 2-ilovasiga muvofiq.

²2018 yildan boshlab nomi Infratech Consulting SDN Ltd deb o'zgartirildi.

3 iyun 2024 yil, nazorat xizmati muddatini uzaytiruvchi shartnomaga 4-sonli o'zgartirishni imzolash bilan tender kechikishi sababli.

30. Nazorat bo'yicha maslahatchi har chorakda qurilish nazorati bo'yicha hisobot va ijtimoiy himoya monitoringi bo'yicha hisobotlarni tayyorlash uchun mas'ul edi. Himoya bo'yicha hisobot himoya vazifalari bo'yicha brifing nazoratini va Pudratchining monitoring hisoboti natijalarini va yarim yillik hisobot uchun tashqi monitoring hisobotini (agar mavjud bo'lsa) umumlashtirishni o'z ichiga olishi kerak. Bu vazifa "Maxsustrans" DUK tomonidan 2023-yil aprel oyidan boshlab bekor qilingan, chunki u PIU va PIU maslahatchilarining bir xil vazifalariga mos keladi. Nazorat xizmatlarining asl tugash sanasi 2023-yil 31-oktabr edi, biroq 2025-yilning fevralida tomonlar xizmat muddatini 2025-yil 30-aprelgacha uzaytiruvchi shartnomaga 4-sonli tuzatishni imzolashlari mumkin edi.
31. 2022-yil aprel oyida CW1-R shartnomasi bo'yicha ishlar boshlanganidan buyon Nazorat bo'yicha maslahatchining ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Pudratchi tomonidan Ijtimoiy harakatlar va gender harakatlar rejalari (jumladan, ko'chirish rejas) bajarilishi monitoringi hamda PIU va "Maxsustrans"ga ijtimoiy himoya talablariga rioya etilishi to'g'risida muntazam hisobot berish uchun mas'ul edi. Bu vazifa 2023-yilning apreligacha bajarildi, chunki keyinchalik "Maxsustrans" tomonidan PIU Maslahatchisining ijtimoiy himoya bo'yicha ekspertining bir xil vazifalari bilan bir xilligi sababli bekor qilindi.
32. Shartnoma bo'yicha CW2: O'tkazish stansiyasini reabilitatsiya qilish bo'yicha qurilish ishlari 2022-yil 31-avgustda yakunlandi. Ishlar Nazorat bo'yicha maslahatchi (Quality Planning Ltd., UZB) va Ish beruvchining (Maxsustrans DUK) qurilish muhandislari tomonidan 2022-yil sentabr oyida foydalanishga topshirildi. O'tkazish stansiyalari 2022 yil sentyabr oyidan beri ishlaydi, ishlash sertifikatini muhandis tomonidan 2023 yil dekabr oyida - ikkala uzatish stantsiyalarida aniqlangan barcha nuqsonlar bartaraf etilgandan so'ng berilgan. O'tkazish stansiyalari "Maxsustrans" DUK uchun ajratilgan yer uchastkasida joylashganligi sababli, yakuniy loyiha bo'yicha yerni kengaytirish yoki olish ko'zda tutilmagan, qurilish ishlari davomida hech qanday ijtimoiy muammolar va cheklovlar aniqlanmagan, bu ishlar Maslahatchi tomonidan nazorat qilindi.

4. 2024-yil iyul-dekabr oylari davomida ijtimoiy himoya tadbirlari

4.1 Hisobotning vazifalari va metodologiyasi

33. 2024 yil iyul-dekabr oylarida o'tkazilgan monitoring davrida ijtimoiy himoya monitoringi quyidagi vazifalarni qamrab oldi:
34. • loyihani amalga oshirishning umumiy jarayonini ko'rib chiqish;
- loyihani amalga oshirishda duch keladigan har qanday ijtimoiy muammolar va cheklovlarni aniqlash;
 - shartnoma bo'yicha qurilish bosqichida ijtimoiy himoya ko'rsatkichlarini nazorat qilish CW1- R;
 - SEJIN G&E CO., LTD kompaniyasining chiqindilarning energiyaga ta'sirini baholash;
 - yumshatish choralarini tavsiya eting (agar kerak bo'lsa).
35. Monitoring va baholash loyihani amalga oshirish OTBning Himoyalash siyosati to'g'risidagi bayonotini (2009 yil) himoya qilish talablarini qo'zg'atmasligini tasdiqlashga qaratilgan.

4.2 Ijtimoiy himoya monitoringi hisoboti doirasi

36. Ushbu hisobot PIU maslahatchisi tomonidan OTBning Himoya siyosatiga muvofiqligini ta'minlash va qurilish jarayonida dastlabki shartlarga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday turli hodisalarni baholash uchun muntazam monitoring o'tkazish maqsadida texnik topshiriqlarga muvofiq tayyorlangan.

yangi poligonning qurilishi, shuningdek, tegishli ravishda oqibatlarini hisobga olish uchun har qanday o'lchov standartlari.

37. Hisobot qurilish ob'ekti bilan bog'liq har qanday ijtimoiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun qurilish davri uchun ishlab chiqilgan monitoring ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi.

4.3 2024 yil iyul-dekabr oylaridagi loyiha faoliyati

38. Janubiy koreyalik tomonidan eski chiqindixonada hech qanday qurilish yoki boshqa harakatlar kuzatilmagan kompaniyasi SEJIN G&E CO., LTD hisobot davrida.
39. OTBning kreditlarni ko'rib chiqish missiyasi 2024-yil 11-15-noyabr kunlari bo'lib o'tdi. Missiya 2024-yil 11-noyabr kuni Oxangaron tumanidagi yangi poligon maydoniga tashrif buyurdi va yangi poligon va kirish yo'li qurilishi tugaganligini aniqladi; biroq yonma-yon joylashgan sug'orish kanalidan suv sizib chiqmasligi va yo'l poydevoriga ta'sir qilmasligi uchun to'sib qo'yilgan. 2024-yil 11-noyabr holatiga ko'ra, "Maxsustrans" kanalni kirish yo'li va chiqindixonani suv bilan bog'liq shikastlardan himoya qilish maqsadida rekonstruksiya qilmoqda. "Maxsustrans" missiyaga ma'lum qildiki, fermer ("Shahboz nuri ziyo" fermer xo'jaligi rahbari Xushnadbek Hakimov ushbu sug'orish kanalidan magistral kanaldan (Hamza kanali) o'zining qishloq xo'jaligi yerlariga suv o'tkazish uchun foydalangan, biroq kanalda qurilish ishlari olib borilayotgani sababli u suvdan mahrum bo'lgan. Biroq OTB jamoasi bilan uchrashuv chog'ida fermer 2023-yil avgust oyidan buyon ekinlarini sug'orishga qurbi yetmayotganini, bu hosildorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatganini, bu esa faqat davlat g'alla kvotasini bajarishga imkon berganini aytdi. Shuningdek, hozirgi g'alla ekinlariga ta'sir qiladigan suv tanqisligi haqida tashvish bildirdi. 2024-yil 12-noyabrda OTB va "Maxsustrans" o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda "Maxsustrans" tomonidan ular chiqindixonadan suv chiqarish orqali vaqtincha suv olish imkoniyati yaratilgani va fermerga zudlik bilan suv kerak bo'lsa, sug'orish kanali qayta ochilishini tasdiqlagani haqida javob berdi.
40. Bundan tashqari, ayni fermer 339-konturdan qonuniy er ijarasi huquqiga ega bo'lgan 2,5 gektar yer uchastkasi hech qanday tovon pulisiz chiqindixona qurish uchun ajratilganini aytib, yer uchun kompensatsiya to'lash bo'yicha tanqidiy masala ko'tardi. Missiya, shuningdek, loyihaga kelib tushgan shikoyatlarni qayd etish va ko'rib chiqish uchun rioya qilishning asosiy talabi bo'lgan Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi (GRM) jurnali yo'qligini ta'kidladi. Bundan tashqari, suv ta'minotining yo'qligi, fermerning 2,5 gektar yer maydonining (339-konturdan) kompensatsiyasiz poligon qurish uchun o'zlashtirilishi kabi masalalar o'tgan yarim yillik ijtimoiy monitoring hisobotlarining birortasiga kiritilmagan.
41. Missiya "Maxsustrans"dan barcha aniqlangan muammolarni, jumladan, 2023-yil avgust oyidan boshlab qishloq xo'jaligi yerlariga ta'siri va yo'qotilgan daromadlari, 2,5 ga qishloq xo'jaligi erlarining yo'qolishi va loyiha darajasidagi GRM yo'qligi kabi masalalarni o'z ichiga olgan Tuzatish Harakatlari rejasini (CAP) tayyorlashni so'radi. CAP batafsil ma'lumot va ma'lumotlarni, shuningdek, zarar ko'rgan fermer bilan maslahatlashuv natijalarini o'z ichiga olishi kerak. Shuningdek, irrigatsiya kanalini rekonstruksiya qilish muddatlari bilan birga bajarilgan va rejalashtirilgan tadbirlarni ham ko'rsatishi kerak. Zarar ko'rgan fermerga kompensatsiya to'lash OTB CAPni rasmiylashtirgandan keyingina boshlanishi kerak. "Maxsustrans"dan 2024-yil 29-noyabrgacha CAPni taqdim etish talab qilingan.
42. Poligonning jismoniy rivojlanishi 2024-yil 11-noyabr holatiga ko'ra kirish yo'li va ma'muriy binoga ega boshqaruv hududi bo'yicha olib borilgan ishlar bilan deyarli 100 foizga erishildi. Loyiha uchastkasi topshirishga tayyor. "Maxsustrans" tomonidan 2,5 gektar yerdagi muammolarning asl mohiyatiga oydinlik kiritish maqsadida bir qancha tadbirlar, tegishli tekshiruvlar va uchrashuvlar o'tkazildi. 2024-yil noyabr oyida bo'lib o'tgan Missiyadan so'ng "Maxsustrans" OTBga muammoni to'gridan-to'g'ri muzokaralar yo'li bilan hal qilishga harakat qilishini tushuntirdi. "Maxsustrans" to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarning kamida ikki raundini o'tkazdi, ammo ikkalasi ham

tomonlar 2025-yil mart oyi o'rtalariga qadar kompensatsiya miqdori va uni yumshatish choralari bo'yicha kelishuvga erisha olmadilar.

43. 2025-yil mart oyining ikkinchi yarmida muzokaralarning uchinchi bosqichidan so'ng "Maxsustrans" fermer bilan 2023-yil avgust oyidan beri yo'qotgan daromadi va 2,5 gektar qishloq xo'jaligi yerlaridan mahrum bo'lgan yer uchun kompensatsiya to'lashni kelishib oldi. "Maxsustrans" tomonidan kelishilgan tovon puli to'langanidan so'ng fermer "Maxsustrans"ga 2025-yil 19-martdagi shartnoma bayonnomasini imzoladi (1-ilovaga qarang) PU-1 sug'orish kanali eskirgan holatda, "Maxsustrans" tomonidan qayta tiklanib, R-7 magistral kanaliga ulangan. Xulosa sifatida fermerning aytishicha, "Shahboz nuri ziyo" fermer xo'jaligi o'tgan yillardagi 30 gektar yer va sug'orish suvining cheklanganligi va miqdori bo'yicha kompensatsiya undirilishidan shikoyati yo'q.
44. "Maxsustrans" tomonidan 2025-yil mart oyi oxirigacha PU-1 sug'orish kanalida so'nggi rekonstruksiya ishlari yakunlangani, fermerning sug'orish suvidan avvalgidek hech qanday cheklovlarisiz to'liq foydalanishi uchun mazkur kanal magistral sug'orish tarmog'iga qaytadan ulangani ta'kidlansin.
45. 2025-yil 3-aprelda Toshkent viloyati hokimi (Z.Mirzayev) va Oxangaron tumanlari hokimlariga (D.Madirimov) mahalliy tartib va talablarga muvofiq, fermer tomonidan notarial tasdiqlangan ariza imzolangan bo'lib, unda fermerning 3,6 gektar qishloq xo'jaligi yerlarini ijaraga berish to'g'risidagi bepul arizasi ko'rsatilgan. Oxangaron tumani rozilik hati (2-ilovaga qarang). Mazkur ariza asosida viloyat va tuman hokimliklari tomonidan 30 gektar yer uchastkasi bo'yicha barcha huquqiy rasmiylashtirish ishlari yakunlanadi va mahalliy kadastr organi "Maxsustrans" tomonidan ob'ekt faoliyati uchun muhim bo'lgan yangi poligonga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishga kirishishi mumkin.

4.4 Qurilish davri uchun loyiha monitoringi

46. Maslahatchi qurilish bosqichida ijtimoiy himoya monitoringini o'tkazish ko'rsatkichlarini ishlab chiqdi. Saytdagi himoya talablari Pudratchi doirasiga kiritilgan. Pudratchi quyidagi ijtimoiy va gender jihatlarini amalga oshirish va monitoringini amalga oshirdi va Maslahatchi quyidagi ko'rsatkichlarni, lekin cheklanmagan holda monitoring qildi:

1-jadval Qurilish bosqichi uchun ijtimoiy himoya monitoringi ko'rsatkichlari (shartnoma CW1-R)

Bosqich	Monitoring ko'rsatkichi	Yumshatish choralari	Mas'uliyatli tashkilotlar
Jamiyat Ta'sirlar	Jamiyat salomatligi va xavfsizligi	• aholi salomatligi va xavfsizligini muhofaza qilish tartib-qoidalarini ishlab chiqish va amalga oshirish ta'minlanadi; • transport vositalari harakati vaqtida aholi xavfsizligini ta'minlash. Loyiha maydoni va yaqin atrofdagi yo'llar uchun avtomobilning minimal tezligini belgilang; • Qochish uchun aholi uchun to'siqlar va ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilgan baxtsiz hodisalar va inson salomatligiga zarar; • Qurilish maydonchasidagi ishlar davom olish vaqtida va amalga oshirilmaydi tunda; • Qurilish maydonchasida uskunaning ishlashi natijasida shovqin / tebranishlarni kamaytirish uchun ovoz yutuvchi qurilmalar o'rnatilishi kerak. • Aholi o'rtasida	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi
	Erlar	• Loyihani amalga oshirish uchun er uchastkalari O'zbekiston Respublikasining zaxira fondidan ajratilgan Toshkent viloyati hokimligi (hokimligi). Loyihani qurish uchun qo'shimcha er uchastkalari talab qilinmaydi; • Barcha qurilish ishlari ajratilgan yer doirasida amalga oshirilishi kerak; • foydalanilayotgan qishloq xo'jaligi erlari hududida qurilish materiallarini saqlashga yo'l qo'yilmaydi; • Ekinlarni sug'orish uchun sug'orish kanallari joylashgan joylarda qurilish materiallarini saqlash va utilizatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi

Bosqich	Monitoring ko'rsatkichi	Yumshatish choralari	Mas'uliyatli tashkilotlar
	Qishloq xo'jaligi ekinlarining nobud bo'lishi	• Qurilish maydonchasiga transport vositalari va jihozlarning kirishi va chiqishi qattiq nazorat ostida bo'lishi kerak. Qurilish maydonchasida harakat faqat mavjud yo'llar doirasida amalga oshirilishi kerak. Foydalanilayotgan qishloq xo'jaligi erlari maydoniga transport vositalarining kirishiga yo'l qo'yilmaydi. • Loyihaga materiallarni etkazib berish va saqlashni to'g'ri tartibga solish sayt taqdim etilishi kerak; • Qishloq xo'jaligi erlariga har qanday ta'sir qilish uchun muntazam monitoring va ekinlarni minimallashtirish va o'z vaqtida kompensatsiya qilish (kerak bo'lsa) amalga oshirilishi kerak.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi
	Daromad yo'qotishlari	• Loyihaning aholiga ta'sirini baholash uchun muntazam monitoring o'tkaziladi. Monitoring natijasida qurilish ob'ekti yaqinida yashovchi/ishlayotgan aholi daromadlariga loyihani amalga oshirish natijasida yuzaga kelgan ta'sir aniqlansa, ta'sirni baholash o'tkaziladi va uni bartaraf etish choralari ishlab chiqiladi.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi
	Mahalliy iqtisodiyot va bandlik	• Qurilish davrida ish bilan bandlik va daromadni oshirish maqsadida iloji boricha mahalliy aholini ish bilan ta'minlash. • Mahalliy aholini, kam ta'minlanganlarni ish bilan ta'minlash va ayollar.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi
	Mavjud ijtimoiy infratuzilma va xizmatlar	• qurilish maydonchasi sanitariya muhofazasi zonasida joylashgan va ijtimoiy infratuzilma ob'ektlaridan chiqarilgan; • Transport mexanizmlari, asbob-uskunalar, qurilish materiallarini tashish va saqlash aholining yo'llar, yo'laklar, kanallar va boshqa ijtimoiy ob'ektlarga kirishini cheklamasligi kerak.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi
	Jamoatchilik uchrashuvlari va maslahatlashuvlar	• Aholini va barcha manfaatdor shaxslar va tashkilotlarni loyihaning joriy holati haqida xabardor qilish. • Zarur bo'lganda, qurilish maydonchasiga yaqin bo'lgan mahallalarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazish.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi


Bosqich	Monitoring ko'rsatkichi	Yumshatish choralari	Mas'uliyatli tashkilotlar
Qurilish maydoni	Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik	• OTB mehnat standartlari va milliy mehnat qonunlariga rioya qilish; • Kirish va foydalanish uchrashuvlari barcha ishchilar tomonidan o'tkazilishi kerak. • Qurilish maydonchasiga transport vositalari va jihozlarning kirishi va chiqishi qattiq nazorat ostida bo'lishi kerak. Qurilish maydonchasida harakat faqat mavjud yo'llar doirasida amalga oshirilishi kerak. Harakat xavfsizligi uchun tezlik chegaralaridan foydalaniladi. • HSE qo'llanmalari va xavfsizlik belgilari va plakatlarni joylashtirishni talab qiladi. • Avtotransport vositalari harakati vaqtida aholi uchun xavfsizlik ta'minlanadi taqdim etilgan. • Baxtsiz hodisalar va inson salomatligiga zarar yetkazmaslik maqsadida aholi uchun panjaralar va ogohlantiruvchi belgilar o'rnatiladi; • Qurilish maydonchasidagi ishlar dam olish vaqtida va amalga oshirilmaydi tunda; • Qurilish maydonchasida uskunaning ishlashidan shovqin / tebranishlarni kamaytirish uchun ovoz yutuvchi qurilmalar o'rnatiladi. • Faqat malakali ishchilar yollanadi. Ishchilar tomonidan shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishni qat'iy belgilang va nazorat qiling. Muntazam tekshiruvlar o'tkaziladi. • Erkaklar va ayollar uchun teng mehnat sharoitlari ta'minlanishi kerak; • Loyihaga materiallarni etkazib berish va saqlashni to'g'ri tartibga solish sayt taqdim etilishi kerak; • Xavfsizlik va salomatlik masalalari bo'yicha xabardorlik va trening dasturlari HSE bo'yicha tayinlangan xodim tomonidan amalga oshiriladi. Barcha ishchilar uchun muntazam ravishda ish joyida xavfsizlik bo'yicha treninglar. Treninglarning to'g'ri qayd etilishi; • Ish joyidagi barcha ishchilar uchun zarur gigiyena vositalari, shu jumladan, ayollar ishchilari uchun tegishli va mos sharoitlarni ta'minlash; • Barcha ishchilar hamda yaqin atrofdagi jamoalar uchun yuqumli kasalliklar va OIV/OITS bo'yicha treninglar o'tkazish. Treninglarning to'g'ri qayd etilishi; • Mahalliy aholi yoki ishchilar tomonidan kelib tushgan har qanday shikoyatlarni ro'yxatga olish ish joyi.	Pudratchi, sanitariya Poligonni loyihalash va PIUning nazorat bo'yicha maslahatchisi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi Kuzatuv uchun maslahatchi

5. Shikoyatlarni bartaraf etish

47. Loyiha bilan bog'liq atrof-muhit muammolarini ovozga chiqarish va hal qilish uchun shaffof mexanizmni ta'minlash uchun EA tomonidan loyihaga oid shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi (GRM) o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga asosan "Maxsustrans" DUKning Toshkent shahridagi har bir tuman bo'limida, shu jumladan, "Maxsustrans" DUK binosida TIB bilan bog'liq so'rovlar uchun bittadan "Xalq qabulxonalari" tashkil etildi. EA loyihani yaratishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kechikishlarning oldini olish uchun shikoyatlar va shikoyatlarning o'z vaqtida va qoniqarli tarzda ko'rib chiqilishini ta'minlaydi.

Quyidagi rasmda shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi batafsil ko'rsatilgan.

Shakl 1 Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi*

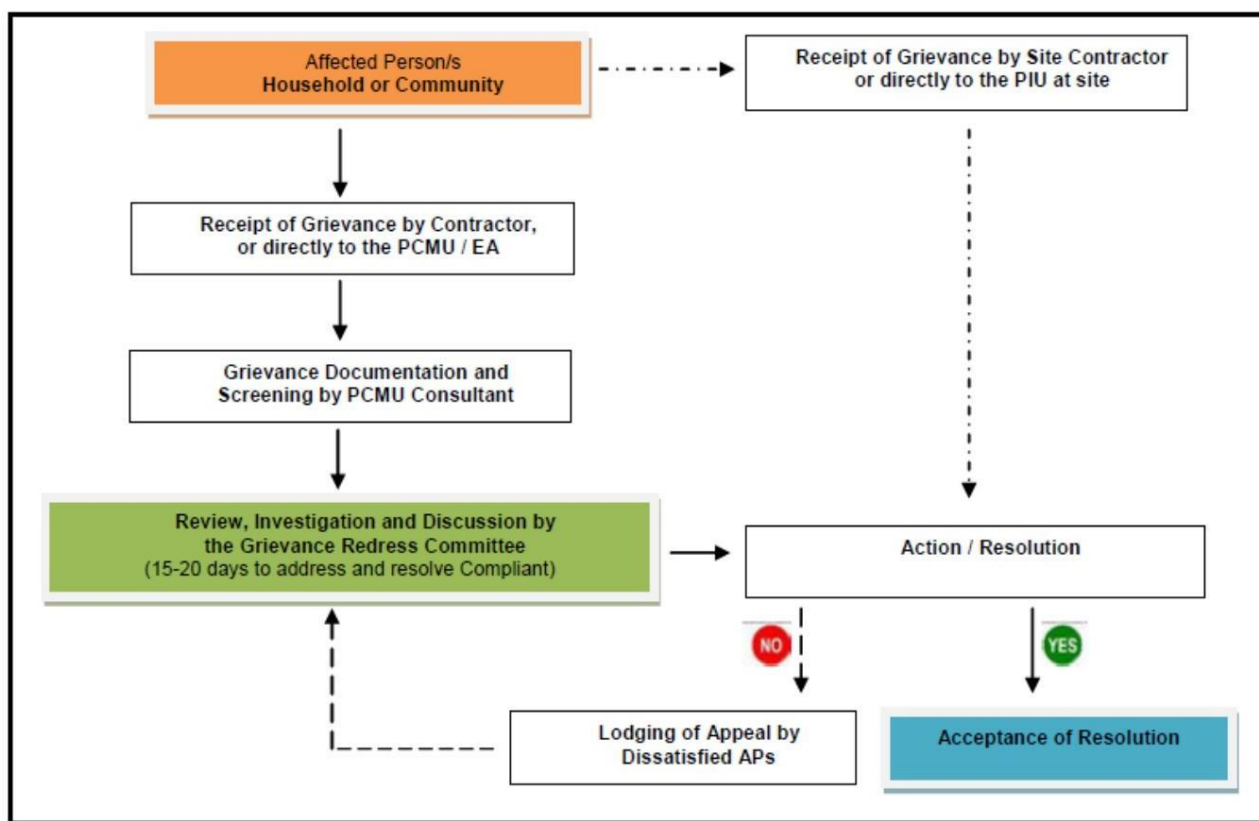


PIU – GRM bo'yicha mas'ul shaxs PIU rahbari vazifasini bajaruvchi Jamoliddin Irbutayev, tel: +998 712473816, email: piu3067@gmail.com; PIU maslahatchisi guruh rahbari o'rinbosari, Dilshod Maviyan-Qariyev, tel: +998 712477923, email: dilshod75@mail.ru

48. PIU Shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha qo'mitani (GRC) tuzdi. GRC har qanday ta'sirlangan odamlarga (AP) loyiha bilan bog'liq har qanday ekologik (yoki ijtimoiy) jihat bo'yicha shikoyat va so'rovlar yuborish uchun joy beradi. Shikoyat yozma yoki og'zaki ravishda pudratchiga yoki to'g'ridan-to'g'ri PIU / IA / EA bilan bog'liq shaxsga topshirilishi mumkin. Ular to'g'ri hujjatlashtirilgan (ya'ni, qabul qilingan sana, shikoyat va shikoyatchi tafsilotlari ko'rsatilgan holda) va PIU xavfsizlik bo'yicha tayinlangan maslahatchi tomonidan uning haqqoniyligi va asosiligi tekshiriladi. Qo'mita ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun 15-20 kun ichida. Ushbu GRMga muvofiq, qanoatlantirilmagan shikoyatlar yakuniy hal qilish uchun shikoyat qilishlari mumkin. Ushbu mexanizm, shuningdek, jarayonning istalgan bosqichida shikoyatlarni hal qilish va yordam berish uchun nazorat qiluvchi organlarga murojaat qilishiga to'sqinlik qilmaydi. AP tomonidan shikoyatlar darhol va shoshilinch deb hisoblangan hollarda; pudratchi, EHS xodimi va PIU joyidagi nazoratchi shikoyatlarni tez hal qilish uchun eng qulay va amaliy echimni taqdim etadi. Bunday shikoyatlar va tegishli qarorlar tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish uchun PIUga taqdim etiladi. PIU bilan bog'liq shaxs shikoyatni, shikoyatni ko'rib chiqish bo'yicha ko'rilgan choralarni, yig'ilishlar bayonnomasini va

har bir shikoyat bo'yicha hisobot tayyorlash. PIU tomonidan olingan barcha shikoyatlar, jumladan, APning aloqa ma'lumotlari, shikoyat kelib tushgan sana, shikoyatning tabiati, kelishilgan bartaraf etish/tuzatish chora-tadbirlari va bu amalga oshirilgan sana va yakuniy natija PIU ofisida saqlanadigan Shikoyatlarni qayd qilish kitobida qayd etiladi.

49. Pudratchi mutaxassislari bilan birgalikda shikoyatlar bo'yicha ish tajribasi ko'rib chiqildi. Shikoyatlarni ko'rib chiqish jurnali yuritildi. Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi bo'yicha plakat tayyorlanib, qurilish maydonchasida bog'lanish uchun telefon raqamlari ko'rsatilgan holda joylashtirildi. Shikoyatlar va takliflar uchun qutilar ham chiqindixona va yaqin atrofga joylashtirildi.

2-rasm - "Shikoyatlarni ko'rib chiqish sxemasi" plakati

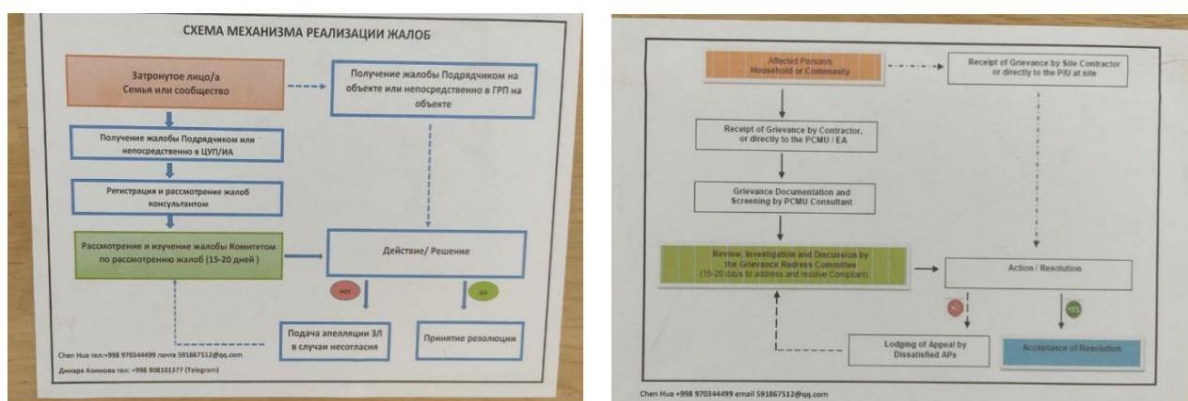

50. Shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayoni monitoring hisobotlari orqali OTBga xabar qilinadi. PIU himoya bo'yicha maslahatchi vaqti-vaqti bilan GRM samaradorligi va samaradorligini ko'rib chiqadi va qayd etadi, bunda loyihaning shikoyatlarni oldini olish va hal qilish qobiliyatini ta'kidlaydi.
51. 2024-yil iyul-dekabr oylarida Ijtimoiy himoya va rivojlanish bo'yicha mutaxassisi PIU maslahatchisi shikoyatlar bo'yicha ma'lumot olish uchun loyiha hududi viloyat va tuman hokimliklari vakillari bilan bog'landi. Monitoring davrida shikoyatlar/manzillar kelib tushmaydi. Maslahatchi loyiha doirasidagi har qanday shikoyatlarni to'g'ri va o'z vaqtida ko'rib chiqishni ta'minlash uchun loyihani amalga oshirish va qurilish ishlarining keyingi bosqichida Loyiha bo'yicha shikoyatlar monitoringini davom ettiradi.

6. Aholini xabardor qilish va maslahatlar

52. Monitoring davrida Maslahatchi ushbu mavzu bo'yicha jamoatchilik maslahatlarini o'tkazmadi Loyiha masalalari.

7. Xulosalar

53. CW1-R: Sanitariya poligonini tashkil etish shartnomasi bo'yicha qurilish ishlari 2024-yil sentabrida yakunlandi va Pudratchi 2024-yil iyuligacha – shartnoma bo'yicha rejalashtirilgan qurilishni yakunlash bo'yicha himoya monitoringi bo'yicha hisobotlarni taqdim etdi. O'zgartirilgan shartnomaga ko'ra, Pudratchi Ijtimoiy rivojlanish va gender harakatlar rejalarga (SAP/GAP), shu jumladan, uzaytirilgan qurilish muddati - 2024 yil 31 iyulgacha ko'chirish rejasiga muvofiqlik xarajatlarini qoplagan.
54. Oxangaron tumanida joylashgan eski chiqindixonada qurilish ishlari olib borilmayapti, chunki ushbu ishlarni loyihadan bekor qilingan.
55. Yangi poligonda qurilish ishlari amalda tugaguniga qadar muhofaza qilish monitoringi xizmatlari PIU maslahatchisining xavfsizlik bo'yicha mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan va natijalar ushbu yakuniy yarim yillik ijtimoiy himoya monitoringi hisobotida keltirilgan.

8. Ilovalar

- 1- ilova: Jabrlangan fermerning 19.03.2025 yildagi rozilik xati (o'zbek tilida)

“Maxsustrans-IChB” ДУКга

2025 йил _19_ март

Охангарон тумани, Тошкент вилояти

РОЗИЛИКНОМА

Тошкент вилояти Охангарон тумани “YANGI XAYOT” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидаги аввал “Shahboz nuri ziyo” фермер хўжалиги фойдаланишида бўлган (қишлоқ хўжалиги харитасининг 337қ, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, ҳамда 345-контурларда жойлашган) 30 гектар ер майдони Тошкент вилояти Охангарон тумани ҳокимининг 2018 йил 25-августдаги 1536-сонли қарорига асосан “Maxsustrans-IChB” ДУКга Осиё таракқиёт банк томонидан молиялаштираётган янги чиқинди полигони қуриш учун ажратиб берилган.

“Shahboz nuri ziyo” фермер хўжалиги фойдаланишидаги (қишлоқ хўжалиги харитасининг 331қ, 332, 333, 334 ҳамда 335-контурларда жойлашган) полиз экинлари етишриляётган экин ер майдонини суғарувчи, аввалдан “Maxsustrans-IChB” ДУКнинг чиқинди полигонлари орасидан ўтиб келган ПЮ-1 ариғи жуда ҳам аянчли авария ҳолатига келган эди. Бугунги кунда “Maxsustrans-IChB” ДУК томонидан ушбу ПЮ-1 ариғи тўлиқ қайта қурилиб яроқли ҳолатга келтирилган ва Р-7 катта ариқга улаб берилди.

Шу муносабат билан бугунги кунда “Shahboz nuri ziyo” фермер хўжалиги томонидан қишлоқ хўжалиги харитасидаги 337қ, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, ҳамда 345-контурлардаги 30 гектар ер майдони тўлиқ Давлат захирасига топширилганлиги сабабли, “Maxsustrans-IChB” ДУКга янги “Чиқинди полигони” қуриш учун ажратилган 30 гектар ер майдони чегаралари, қишлоқ хўжалиги харитасидаги 337қ, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, ҳамда 345-контурлари бўйича ҳамда янги қайтадан қуриб битказилган Р-7 катта ариқга улаб берилган ПЮ-1 сув ариғи юзасидан ва аввалги йилларда суғариш сув тансиқлиги туфайли бўлган зарарлар бўйича эътирозим ва даъвойим йўқ.

“Shahboz nuri ziyo” ФХ раҳбари



Х.А. Ҳақимов

2- ilova: Jabrlangan fermerning 19.03.2025 yildagi rozilik xati (ingliz tilida)

To the State Enterprise "Maxsustrans-IChB"

_19_March 2025 year

**Akhangaron district,
Tashkent region**

AGREEMENT

In accordance with the resolution No. 1536 of the khokim of the Ahangaran district of Tashkent region dated August 25, 2018, a 30-hectare area of land in the "YANGI XAYOT" mahalla citizens' assembly of the Ahangaran district of Tashkent region, previously used by the "Shahboz nuri ziya" farm (located on contours 337q, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, and 345 of the rural economy map), was allocated to the "Maxsustrans-IChB" state enterprise for the construction of a new landfill financed by the Asian Development Bank.

The PYU-1 ditch, which irrigates the melon fields used by the "Shahboz Nuri Ziya" farm (located on contours 331q, 332, 333, 334 and 335 of the farm map), which previously passed through the landfills of the "Maxsustrans-IChB" State Enterprise, had fallen into a very sad state of disrepair. Today, the "Maxsustrans-IChB" State Enterprise has completely reconstructed this PYU-1 ditch and brought it into a usable condition and connected it to the large R-7 ditch.

In this regard, since today the 30 hectares of land in contours 337q, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, and 345 on the agricultural map have been fully transferred to the State Reserve by the "Shahboz Nuri Ziya" farm, I have no objections or claims regarding the boundaries of the 30 hectares of land allocated to the "Maxsustrans-IChB" State Enterprise for the construction of a new "Waste Landfill", contours 337q, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, and 345 on the agricultural map, and the newly reconstructed PYU-1 water ditch connected to the large R-7 ditch, and the damages caused by the scarcity of irrigation water in previous years.

Head of the "Shahboz Nuri Ziya" Public Association



Khakimov H.A.

3- ilova: Jabrlangan fermerning 2025 yil 3 apreldagi ariza xati

Ф.Х." SHAHBOZ NURI ZIYO" F.X

Тошкент вилояти, Охангарон тумани, "Янги Хаёт" МФЙ ҳудуди, тел: 99-807-53-94;

"03" "апрел" 2025 йил

№ 2-сонли

Тошкент вилояти

Ҳокими

З.Т.Мирзаевага

Нусхаси: Охангарон туман Ҳокими

Д.М.Мадиримовга

Охангарон тумани Янги ҳаёт МФЙ

ҳудудида фаолият юритаётган

Шахбоз нури зие ф.х раиси


Х.Ҳакимовдан

Ариза


Аризамнинг мазмуни шундан иборатки менинг бошқарувимдаги "Янги Хаёт" МФЙ ҳудудида фаолият олиб бораётган "Шахбоз нури зие" фермер хужалигига Охангарон туман Ҳокимининг 18.05.2020 йилдаги 1844-сонли қарорига асосан узок муддатли ижарага берилган ер майдонини бир қисмини яъни кишлоқ хужалик харитасининг Янги ҳаёт массивидаг 339 контурдаги жами 3.6 гектар ер майдонини ихтиёрий равишда туман захирасига қайтаришига рухсат беришингизни илтимос қиламан.

"Шахбоз нури зие"

фермер хужалиги раиси



Х.Ҳакимов



Ўзбекистон Республикаси "Нотариат тўғрисида"ги Қонуннинг 67-моддасига асосан, нотариус имзонинг хакикийлигини шаҳодатлар экан, ҳужжатда баён этилган фактларни эмас, балки фақат имзонинг муайян шахс томонидан қўйилганлигини тасдиқлайди.

ИМЗО:

Хакимов Хушнуд Абдусаматхужайевич
Шахси: АВ/6001776 рақамли, Тошкент вилояти Охангарон тумани ИИБ томонидан 20.02.2017 йилда берилган Ўзб.Рес. фуқароси биометрик паспортига асосан аниқланди, ЖШШИР: 31805730620029.

2025 йил апрел ойининг 03 кuni, мен, Тошкент вилояти, Охангарон шаҳар, А.Темур кўчаси, 18-уй, 6-дўкон манзилида жойлашган Тошкент вилояти Охангарон шаҳрида хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус САТТАРОВ ШОХЗОД НУРАЛИ Ўғли фуқаро ХАКИМОВ ХУШНУД ABDUSAMATXUJAYEVICHнинг менинг ҳузуримда қўйган имзосини хакикийлигини шаҳодатлайман.

Шунингдек, "SHANBOZ NURI ZIYO" FERMER XO'JALIGIнинг ҳуқуқий лаёқати ва вакилнинг ваколатлари текширилди.

Ҳужжатни имзоловчи кишининг шахси аниқланди, муомалага лаёқатлилиги текширилди, шахсий мулоқот давомида унинг муомалага лаёқатлилигига шубҳа туғдирмади.

Электрон реестрга 20250249400 1105 рақами билан кайд этилди.

Давлат божи: 18 750.00 (ун саккиз минг етти юз эллик) сўм.

Тушунтириш учун ҳақ миқдори: 18 750.00 (ун саккиз минг етти юз эллик) сўм.

Битим лойиҳасини тузиш учун ҳақ миқдори: 37 500.00 (уттиз етти минг беш юз) сўм.

Нотариус:

Ш.Н.Саттаров



Ushbu elektron qo'shimcha notaturni e-notarius.az elektron dastlab o'zlashtirish uchun mo'ljallangan.
